

创意银航（山东）技术有限公司

变更管理流程

编制机构： 运维部

编制时间： 2022 年01月 6日版

本名称：CYYH-ITSS-15-06

文件起草人：张延山

文件审核人：姜晓建

文件审批人：谢晓彤

生效时间： 2022 年 01 月 8 日

文件修改记录

文件版本	修订内容	修改人	审核人	生效日期
V1.0	初始版本，文档建立	张延山	姜晓建	2022.1.8

目录

1 文档简介.....	4
2 适用范围.....	4
3 流程目标.....	4
4 流程策略.....	5
4.1 变更类型策略.....	5
4.2 变更评估策略.....	5
4.3 裁剪策略.....	6
5 流程角色和职责.....	6
5.1 变更顾问委员会（CAB）.....	6
5.2 服务台专员.....	6
5.3 变更实施人员.....	6
6 流程描述.....	7
7 流程指标.....	8
8 流程持续改进.....	9

1 文档简介

本文档定义了变更管理流程，主要包括：

- 流程目标，描述变更管理流程所要达到的目标；
- 流程描述，包括流程图、活动描述及输入输出；
- 流程角色和职责，描述流程中主要的角色，以及角色所担负的职责和需要具备的技能要求；
- 流程指标，定义了衡量流程管理绩效的指标；
- 流程持续改进，定义流程回顾和改进方法。

2 适用范围

变更管理流程适用的范围主要是运维服务，服务模式包括驻场式及非驻场式。业务线条包括：

- 硬件运维服务业务线；
- 软件运维服务业务线。

3 流程目标

通过变更管理流程，可以规范各类变更的实施过程，进而保证变更操作实施对外部客户项目环境及业务带来的风险降到最低，提升服务质量，为业务的快速发展提供支撑。

4 流程策略

4.1 变更类型策略

■ 紧急变更

紧急变更指的是如果不进行变更，会立即或正在严重影响业务运行、导致严重影响 SLA 的变更。紧急变更的实施往往无法获得足够的相关人员的参与和充分的测试，因此针对紧急变更需要采取特别的紧急处理流程。

■ 重大变更

指涉及影响范围较大（影响业务的运行）、紧急程度较高（需要在某个时间内完成实施）、实施风险较高（操作实施失误会导致较大影响）、实施较复杂的变更。

■ 常规变更

指涉及影响范围较小（不影响业务的运行）、紧急程度较低（不需要立即实施）、实施风险较小（不会带来重大后果）、实施较简单的变更。

■ 标准变更

指的是那些经常发生、有着基本固定流程、并已被授权可直接执行的变更。变更类型与技术支持合同相关，如有合同定义，则以合同定义为准。

4.2 变更评估策略

变更类型	评估成员	成员组成
紧急变更	ECBA	部门经理、项目经理、运维技术支持、变更实施人员
重大变更	CBA	项目经理、运维技术支持、变更实施人员
常规变更	CBA	运维技术支持、变更实施人员
标准变更	—	—

变更评估策略与技术支持合同相关，如有合同定义，则以合同定义为准。

4.3 裁剪策略

项目经理应和客户商定变更的类型、评估策略。项目经理可根据项目环境裁剪本过程，报经公司管理层批准。

5 流程角色和职责

5.1 变更顾问委员会（CAB）

- 针对具体变更请求，评估是否批准通过并分派相应资源；
- 回顾评审所有提交的变更请求，并确保它们的潜在影响和风险得到评估；
- 回顾评审所有已执行的变更，确保满足变更目的；
- 参加 CAB 会议和紧急 CAB 会议；
- 指导服务台专员确定变更类型及变更计划。

5.2 服务台专员

- 负责受理、记录变更请求，收集、记录相关信息，包括变更需求具体描述及相关环境信息等；
- 负责对变更进行识别分类，并分派变更实施任务给相应工程师，对工程师进行协调，充分了解各工程师的工作负载及进度情况；
- 对工程师的变更实施过程进行管控，确保遵守相关流程、管理制度及工作规范要求。


5.3 变更实施人员

- 制定变更实施方案、变更实施计划；
- 纪录变更实施相关的信息，确保文档的完整性；
- 负责实施和测试；
- 变更完成后，进行监控，并记录监控结果；
- 与服务台专员沟通，通报变更实施的进度和结果；

- 对变更实施过程的经验进行总结，形成知识文档提交到知识库中。

6 流程描述

6.1 流程图

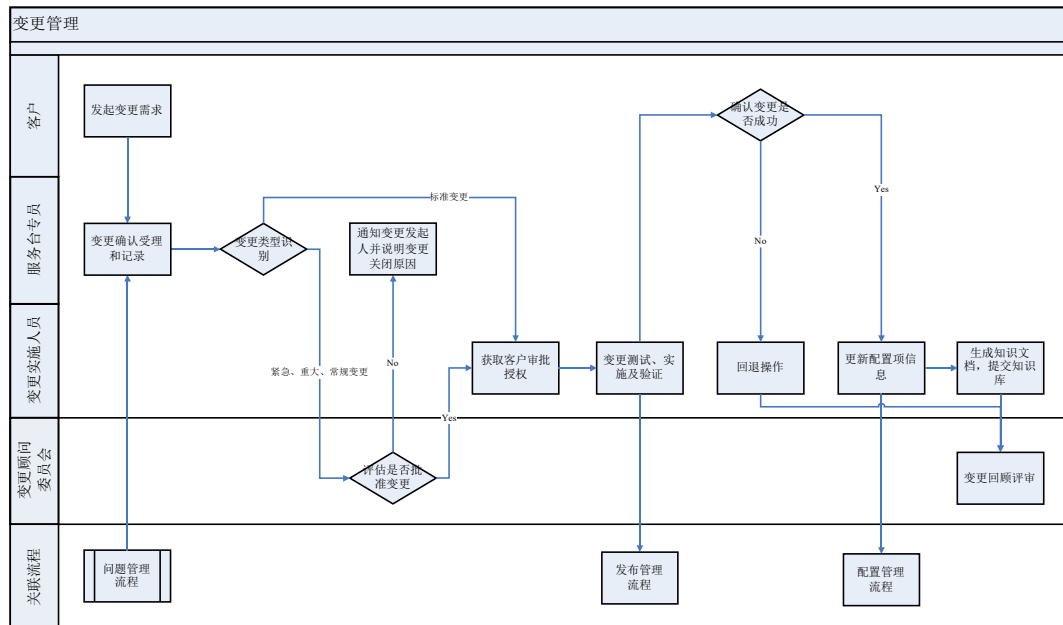

6.2 流程说明

活动	描述	责任人	输入	输出
变更确认受理和记录	接受变更请求, 检查变更请求的完整性和正确性, 将变更请求登记到《变更记录表》当中	服务台专员	变更请求	变更记录表
变更类型识别	按照变更类型策略定义识别判断变更类型, 按照变更评估要求分别提交给不同人员进行变更评估	服务台专员	变更记录表	变更记录表

评估是否批准变更	变更评估人员对变更请求进行分析，评估是否通过批准变更	CAB	变更记录表	变更记录表
获取客户审批授权	在客户内部通过审批流程，获得客户对变更实施的审批授权	变更实施人员		
通知变更发起人并说明变更关闭原因	将变更不批准通过的原因详细告知变更发起人	服务台专员		
变更测试、实施及验证	准备变更实施工作，包括方案编写、资源协调及测试等，按照变更方案实施变更操作和验证，并评估是否需要触发发布管理流程	变更实施人员	变更实施方案	变更实施报告
回退操作	对于变更操作实施失败的，按照方案准备的回退进行回滚操作	变更实施人员	变更实施方案	变更实施报告
更新配置项信息	将变更实施过程中的相应配置项信息进行更新	变更实施人员		配置项信息
生成知识文档，提交知识库	总结变更实施过程的经验，形成知识文档提交到知识库	变更实施人员	变更实施报告	知识文档
变更回顾评审	按变更的风险级别由变更委员会对变更的绩效和改进记录进行评审，评审结果应妥善保管并作为服务改进计划的输入	CAB	变更实施报告	变更评审报告

7 流程指标

为保证变更管理流程的有效性，定义以下关键绩效指标（KPI）和其他相关评价标准用以衡量变更管理流程的有效性和效率：

变更成功率 = $1 - (\text{回退变更次数} / \text{变更次数总数}) * 100\%$ 。

8 流程持续改进

- 流程负责人定期开展变更管理流程回顾工作，召开回顾会议，与流程相关人员讨论流程实施及流程改进措施。
- 流程负责人根据会议讨论的内容，进一步制定流程改进点，同时将对流程的改进写进服务改进计划。
- 执行改进计划：流程负责人组织协调相关人员，执行流程改进计划。
