

创意银航（山东）技术有限公司

发布管理流程

编制机构： 运维部

编制时间： 2025年1月8日

版本名称： CYYH-ITSS-15-07

文件起草人： 张延山

文件审核人： 姜晓建

文件审批人： 谢晓彤

生效时间： 2025年1月8日

文件修改记录

文件版本	修订内容	修改人	审核人	生效日期
V1.0	初始版本，文档建立	张延山	姜晓建	2025.1.8

目录

1 文档简介.....	4
2 适用范围.....	4
3 流程目标.....	4
4 流程策略.....	5
4.1 发布类型策略.....	5
4.2 发布计划策略.....	5
4.3 裁剪策略.....	5
5 流程角色与职责.....	6
5.1 服务台专员.....	6
5.2 发布实施人员（运维技术支持或者技术研发人员）.....	6
6 流程描述.....	7
7 流程指标.....	8
8 流程持续改进.....	9

1 文档简介

本文档定义了发布管理流程，主要包括：

- 流程目标，描述发布管理流程所要达到的目标；
- 流程描述，包括流程图、活动描述及输入输出；
- 流程角色和职责，描述流程中主要的角色，以及角色所担负的职责和需具备的技能要求；
- 流程指标，定义了衡量流程管理绩效的指标，主要包括效率与效能两方面的指标；
- 流程持续改进，定义流程回顾和改进方法。

2 适用范围

发布管理流程适用的范围主要是运维服务，服务模式包括驻场式及非驻场式。业务线条包括：

- 硬件运维服务业务线；
- 软件运维服务业务线。

3 流程目标

发布管理负责对即将导入实际运营环境的软件和硬件版本进行管理和分发，通过规范发布部署过程，确保所涉及的软、硬件是可跟踪的、安全的，相应的版本都是正确、经检验和批准的。并确保所发布的软、硬件相应的使用、维护知识正确传达至用户及维护人员，进而保证发布完成后的服务交付质量。

4 流程策略

4.1 发布类型策略

■ 紧急发布

紧急发布指的是如果不进行发布，会立即或正在严重影响业务运行、导致严重影响 SLA 的发布。紧急发布的实施往往无法获得足够的相关人员的参与和充分的测试，因此针对紧急发布需要采取特别的紧急处理流程。

■ 常规发布

指涉及影响范围较小（不影响业务的运行）、紧急程度较低（不需要立即实施）、实施风险较小（不会带来重大后果）、实施较简单的发布。

发布类型与技术支持合同相关，如有合同定义，则以合同定义为准。

4.2 发布计划策略

发布计划必须与客户、相关业务部门、原厂商支持人员进行商讨，常规发布的时间应安排在工作时间（紧急发布时间视实际情况而定）。

当月月末需制定下月各业务系统发布计划，并确定发布工作主要内容、计划时间、影响业务范围、影响用户范围、实施人员等信息。非发布计划内的紧急发布应由客户、相关业务部门确认后方可实施。

4.3 裁剪策略

项目经理应和客户商定发布的类型、发布计划策略。项目经理可根据项目环境裁剪本过程，报经公司管理层批准。

5 流程角色与职责

5.1 服务台专员


- 负责受理、记录发布请求，收集、记录相关信息，包括发布需求具体描述及相关环境信息等；
- 负责对发布进行识别分类，并分派发布工作任务给相应工程师，对工程师进行协调，充分了解各工程师的工作负载及进度情况；
- 对工程师的分发部署过程进行管控，确保遵守相关流程、管理制度及工作规范要求。

5.2 发布实施人员（运维技术支持或者技术研发人员）

- 制定发布计划，确保发布过程的完整性，包括测试，回退计划；
- 创建发布测试环境，执行测试；
- 对用户和维护人员进行必要的培训；
- 纪录发布部署实施相关的信息，确保文档的完整性；
- 与服务台专员沟通，通报发布实施的进度和结果。

6 流程描述

6.1 流程图

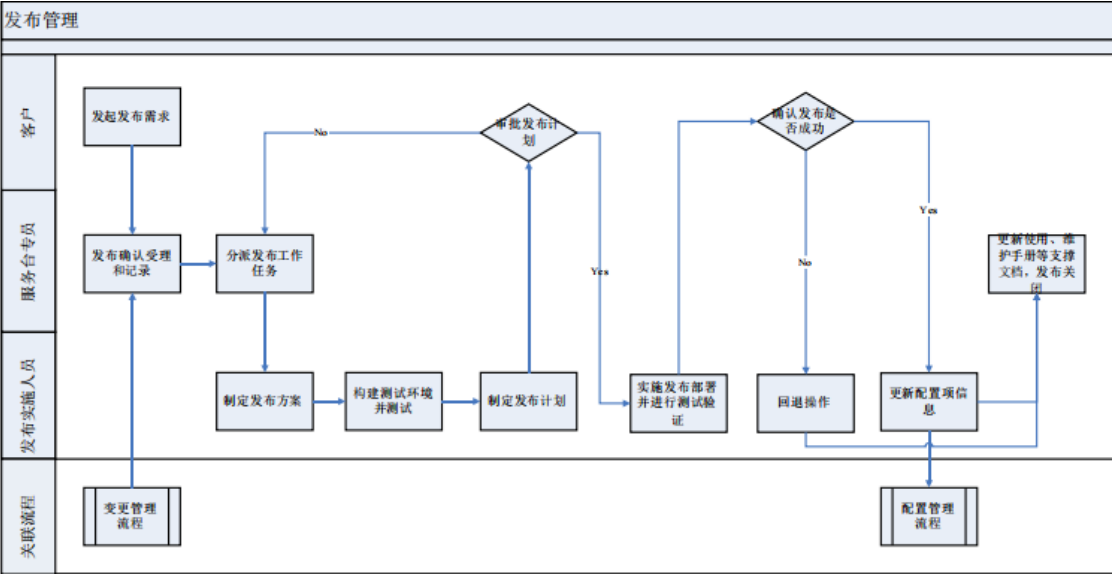

6.2 流程说明

活动	描述	责任人	输入	输出
发布确认受理和记录	接受发布请求, 检查发布请求的完整性和正确性, 收集发布请求详细信息并进行登记	服务台专员	发布需求	发布登记表
分派发布工作任务	根据发布内容分派到发布实施人员	服务台专员	发布登记表	发布登记表
制定发布方案	发布方案主要内容应包括: 1. 描述发布的目的及影响范围; 2. 所涉及系统的历史数据、配置参数、应用程序等的备份方案; 3. 系统发布执行的内容和步骤、各项工作任务责任人、人员组织和具体时间安排等;	发布实施人员		发布方案

	4. 发布失败后的回退计划； 5. 发布时可能出现的问题及解决方案； 6. 分发和部署完成后，其它工作安排。			
构建测试环境并测试	发布方案实施之前应先由测试人员对方案进行测试，测试人员的测试环境尽量与实际环境相同。测试包括：技术操作、功能方面、性能方面、与其他 IT 组件的兼容性	发布实施人员	发布方案	测试结果
制定发布计划	与客户、相关业务部门商讨制定发布计划	发布实施人员	发布方案	发布计划
实施发布部署并进行测试验证	按照发布方案及发布计划进行分发、部署。发布完成后应进行测试验证发布是否成功，并由客户、相关业务部门等相关干系人对发布结果进行确认	发布实施人员		发布结果
回退操作	若发布失败，按照回退计划进行回退操作	发布实施人员		
更新配置项信息	对发布过程中相关的配置项信息进行更新	发布实施人员		配置项信息
更新使用、维护手册等支撑文档	按照发布内容，更新相应使用、维护手册，必要时应对用户和维护人员进行培训	服务台专员		使用手册 维护手册

7 流程指标

为保证发布管理流程的有效性，定义以下关键绩效指标（KPI）和其他相关评价标准用以衡量发布管理流程的有效性和效率：

发布成功率 = $1 - (\text{回退发布次数} / \text{发布次数总数}) * 100\%$ ，季度考核，指标 $\geq 95\%$

8 流程持续改进

- 流程负责人定期开展发布管理流程回顾工作，召开回顾会议，与流程相关人员讨论流程实施及流程改进措施。
- 流程负责人根据会议讨论的内容，进一步制定流程改进点，同时将对流程的改进写进服务改进计划。
- 执行改进计划：流程负责人组织协调相关人员，执行流程改进计划。
